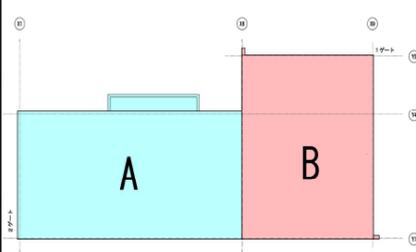


京都大学(熊取)第二研究棟新営その他工事

10 月度月間工程表(建築)

| | | | |
|------|-------|-------|-----|
| 監督職員 | 現場代理人 | 監理技術者 | 作成者 |
| | | | |

| 工事項目 | 2022年10月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 工期 | | | |
|------------------------------|-------------------|-------------|----------|---|---|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|----|--------------|----|----|-------|-------------|---------------------------------|----|-----------|----|----|--------------|---------------------------------|----------|----|----|----|-------------|----|----|---------------|-------------|--------------|-----|---|
| | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 自 2022年1月18日 | | |
| | 曜 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 至 2024年3月29日 | | |
| 仮設工事 | | X1-X4足場解体 | | | | | | | X1-X4足場組 | | | | | | | | X4-X9足場解体 | | | | | | | X4-X9足場組 | | | | | | | | | | |  <p>A工区X1~X6 B工区X6~X9</p> |
| 防水、左官工事 | | B1階外部塗布防水 | 地中梁部塗布防水 | | | | | | | | | | | | | | | | 室内下地補修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土工事 | | | 基礎埋戻 | | | | | | | | | | | | | | | | 基礎埋戻 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コンクリート工事 A | | | | | | | | | | | | | | | スラブ止め | | | | 1階X1-X4コン | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉄筋工事 B | | | | | | スラブ止め | スラブ止め | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉄筋工事 A | | | | | | B1階X4-X6コン | | | | B1階X6-X9コン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉄筋工事 B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 型枠工事 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 型枠工事 B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内装工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 共同溝 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事車輛 1ゲート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事車輛 2ゲート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 検査予定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 月間予定 行事・会議 各種点検・パトロール等 | 安全 全 大 会 | 全 休 日 | | | | 第30回 定例会議 | 店社安全 パトロール | 全 休 日 | 全 休 日 | | | 第31回 定例会議 | | | | 全 休 日 | 大 阪 府 中 間 検 査 | | | | | 第32回 定例会議 | 安 全 衛 生 協 議 会 | | | | | 全 休 日 | | | 第33回 定例会議 | 全 休 日 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 進捗状況(前月25日現在) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 予定 | 36% | 実施 | 33% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 連絡事項その他 | | | | |
