


京都大学(熊取)第二研究棟新営その他工事

12 月度月間工程表(建築)

監督職員 現場代理人 監理技術者 作成者



工事項目	2022年12月																															工期									
	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	自 2022年1月18日								
	曜	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	至 2024年3月29日								
仮設工事																																									
鉄骨工事																																									
コンクリート工事 A																																									
B																																									
鉄筋工事 A																																									
B																																									
型枠工事 A																																									
B																																									
共同溝内部解体																																									
コンウチ相番																																									
工事車輛 1ゲート																																					進捗状況(前月25日現在)				
2ゲート																																						予定	56 %	実施	46 %
検査予定																																						連絡事項その他			
月間予定 行事・会議 各種点検・パトロール等	安定 全工 程大 会 会議				全			店 社 安 全 パ ト ロ ール	定 例 工 程 会 議			全				定 例 工 程 会 議			全				総 合 定 例 会 議	安 全 衛 生 協 議 会			全				全	全			休	休					

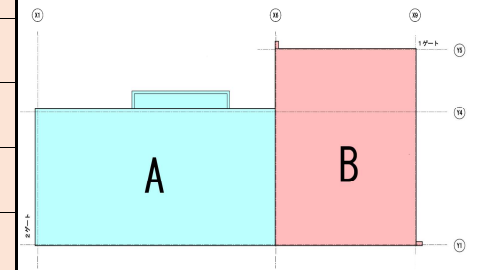


A工区X1~X6
B工区X6~X9
年末年始休暇
12/30~1/5

京都大学(熊取)第二研究棟新営その他工事

12 月度月間工程表(建築内装)

監督職員	現場代理人	監理技術者	作成者

工事項目	2022年12月																															工期							
	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	自 2022年1月18日						
	曜	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	至 2024年3月29日						
外部																																							
3階																																							
2階																																							
1階																																							
B1階	サッシ廻りボード貼り																																						
工事車輛																																							
1ゲート																																							
2ゲート																																							
検査予定																																							
月間予定 行事・会議 各種点検・パトロール等	定安 例全 工程大 議会				全							全																											
進捗状況(前月25日現在)																																				予定	56 %	実施	46 %
連絡事項その他																																							

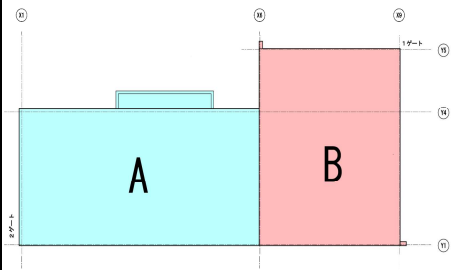

A工区X1~X6
 B工区X6~X9
 年末年始休暇
 12/30~1/5

予定	56 %	実施	46 %
----	------	----	------

京都大学（熊取）第二研究棟その他新築設備工事 基幹工事 12月月間工程表	工期 2022年1月13日～2024年3月29日	建築主 国立大学法人 京都大学	構造 RC造	階数 地下1階地上3階	柳生設備株式会社		
		設計 京都大学施設部	延面積	着工 令和4年1月14日	監理技術者	現場代理人	担当者
		監理					
		建築地 泉南郡熊取町朝代西2丁目	延面積 4337.98㎡	竣工 令和5年3月29日			

