


京都大学(熊取)第二研究棟新営その他工事

8月度月間工程表(建築・機械・電気)

| | | | |
|------|-------|-------|-----|
| 監督職員 | 現場代理人 | 監理技術者 | 作成者 |
| | | | |

| 工事項目 | 2022年8月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 工期 | | | | | |
|-------------|---------|--------|--------|---|--------|---|---------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|----|-------|----|-------------|----|----|----|----|----|------------|------------|--|--|--|
| | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 自 | 至 | | | |
| | 曜 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 2022年1月18日 | 2024年3月29日 | | | |
| 仮設工事 | ラス止め | | 止水ゴム入れ | | | | EVピット埋戻 | | | | | | | | | | | | | | | | X5~X9セパ埋 | | 外周セパ埋 | | | | | | | | | | | | |
| コンクリート工事 | | X1~X5間 | | | X1~X5間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | X5~X9打設足場組 | | X5~X9 | | X5~X9通路足場解体 | | | | | | | | | | |
| 鉄筋工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 型枠工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事車輛 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 検査予定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 月間予定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行事・会議 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 各種点検・パトロール等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

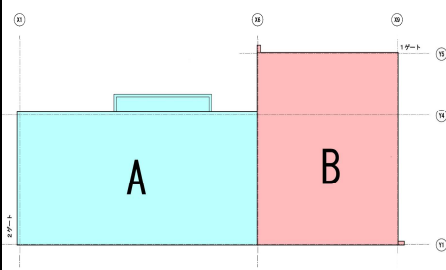

A工区X1~X6
B工区X6~X9

| | | | |
|---------------|-----|----|-------|
| 進捗状況(前月25日現在) | | | |
| 予定 | 26% | 実施 | 21.2% |

連絡事項その他
