


京都大学(熊取)第二研究棟新営その他工事

4月度月間工程表(外部)

監督職員	現場代理人	監理技術者	作成者
		温井	岡崎

工事項目	月	2023年4月																														工期						
	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	自	至					
	曜	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	2022年1月18日	2024年3月29日					
仮設工事					北面足場解体		南面足場解体		西面足場解体																													
外部				北面サッシクリーニング		西面サッシクリーニング																																
屋上				バルコニー手摺		土間、溝手摺立																																
外構				西面2.3階吹付																																		
屋外				X1-X6シート防水																																		
室外機置場																																						
南壁面																																						
工事車輛	1ゲート																																					
	2ゲート																																					
検査予定																																						
月間予定 行事・会議 各種点検・パトロール等																																						

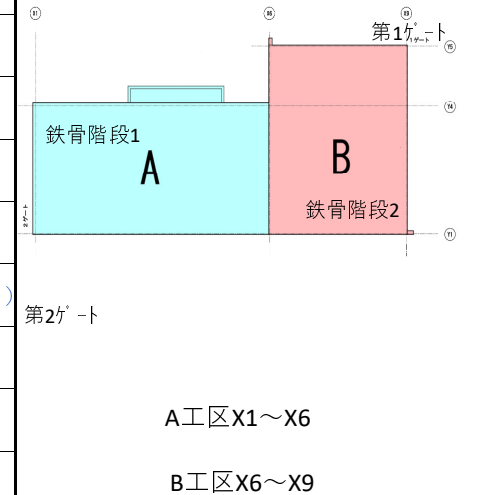

進捗状況(前月25日現在)			
予定	%	実施	%

連絡事項その他

京都大学(熊取)第二研究棟新営その他工事


4月度月間工程表(内装)

監督職員		現場代理人	監理技術者	作成者
		温井	岡崎	岡崎

工事項目	月	2023年4月																													
	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	曜	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日

工期	自 2022年1月18日
	至 2024年3月29日

<b>3階</b>		天井下地、ジブトーン								LD扉吊込 ガラス								クリーニング																									
		床シート、クロス															調整																										
		SD扉搬入 扉塗装							トイレブース							SD扉吊込																											
		階段塗装							階段手摺							階段床コンパネ 階段シート																											
<b>2階</b>		床シート、クロス								SD扉搬入 扉塗装							LD扉吊込 ガラス								クリーニング 調整																		
		階段塗装							階段手摺							階段床コンパネ							検査、手直し							引渡し													
<b>1階</b>		階段塗装							階段手摺							階段床コンパネ							階段シート							調整													
<b>B1階</b>		階段塗装							階段手摺							階段床コンパネ							階段シート							調整													
<b>屋上</b>	屋上ダクト施工	屋上ダクト施工	放水試験(自主)							FAN廻り施工							消防検査																										
<b>3階</b>	室外機廻り配管							パネル取付							衛生器具取付							パネル取付							空調機試運転(3階・2階)	検査	引渡し												
<b>2階</b>	未済事項手直し・多目的トイレ紙巻き器取付							未済事項手直し・電気室室外機設置(4/5)・ポンプ運転確認							空調機試運転(3階・2階)							検査																					
<b>屋上</b>	屋上ダクト施工							太陽光パネル搬入							太陽光パネル設置																												
<b>3階</b>	幹線入線							ラック上配線							器具付け							屋上配管配線							試験調整							検査							引渡し
<b>2階</b>	器具付け							試験調整							試験調整							試験調整							検査														
<b>1階</b>	未済事項手直し							電話・LAN試験調整							電話・LAN試験調整							電話・LAN試験調整							検査														
<b>B1階</b>	未済事項手直し(停電)							電気室幹線延線(停電)							電話・LAN試験調整							電話・LAN試験調整							電話・LAN試験調整														
<b>工事車輛</b>	<b>1ゲート</b>																																										
	<b>2ゲート</b>																																										



A工区X1~X6  
B工区X6~X9

進捗状況(前月25日現在)					
予定	65	%	実施	55	%

連絡事項その他

<b>月間予定</b>																															
<b>行事・会議</b>																															
<b>各種点検・パトロール等</b>																															

工期 2022年1月13日～2024年3月29日  
 京都大学（熊取）第二研究棟その他新営設備工事 基幹工事 4月月間工程表

建築主 国立大学法人 京都大学  
 設計 京都大学施設部  
 監理  
 建築地 泉南郡熊取町朝代西2丁目



構造 RC造  
 延面積 4337.98㎡

階数 地下1階地上3階  
 着工 令和4年1月14日  
 竣工 令和5年3月29日

柳生設備株式会社

監理技術者 現場代理人 担当者

作業	期間	4月																												5月				
	3月	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	
基幹工事		金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
非破壊検査測定室																																		
単色中性子実験室																																		
小物倉庫																																		
原子炉棟																																		
トレーサ棟																																		
環境測定棟前・工作棟																																		
汚染物貯蔵庫																																		
第一研究棟前																																		
CA棟																																		
イノベーションラボラトリ																																		
体育館																																		
変電所近辺																																		
トレーサ棟東側																																		
原子炉棟北西側																																		
原子炉棟北東側																																		
事務棟北西側																																		
ガレージ北側																																		
守衛棟東側																																		
工作棟東側																																		
原子炉棟南西側（管理区域）																																		
研究員宿泊所北側																																		
第二研究北面																																		
共同溝内工事																																		
基幹工事（電気設備）																																		
弱電ケーブル敷設																																		
原子炉監視設備																																		
放送設備																																		
自動火災報知設備																																		
情報通信、交換設備																																		

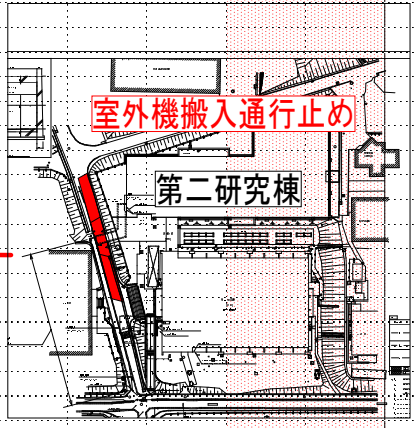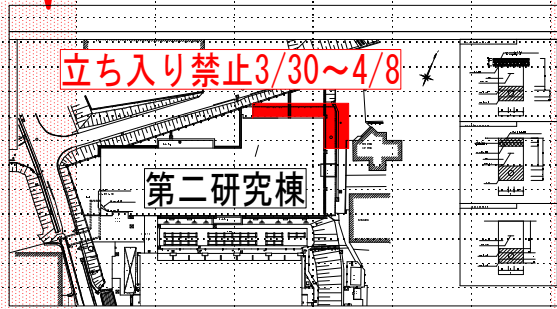

# 月 間 工 程 表 [ 4 月 分 予 定 ・ 実 施 ]

令和5年3月13日作成

No. 5	京都大学(熊取)基幹・環境整備(放射線施設防犯設備等)工事		池田建設株式会社		工期	着工 令和4年10月18日	現場代理人																																				
						完成	令和5年 7月28日																																				
								大池 誠																																			
間 種 別	R5.3月											R5.4月														4月出来型																	
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	予定	実施
曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	45%	%
仮設工事	●																																										
建築工事⑪⑫工区												フェンスバリケード設置																															
建築工事⑬工区(撤去工)	フェンス・基礎・基礎土被り・門扉・コンクリートベース撤去											メッシュフェンス設置																															
建築工事⑬工区(基礎・フェンス工)	基礎ブロック設置・フェンス設置											門扉基礎・捨コン打設																															
建築工事⑭工区(撤去工)	フェンス・基礎撤去・土被りU・水路一部撤去											型枠組立門扉枠設置																															
建築工事⑭工区(基礎・フェンス工)	基礎ブロック設置・U水路復旧・フェンス設置											生コン打設養生																															
建築工事⑮工区(撤去工)												脱枠																															
建築工事⑮工区(基礎・フェンス工)												ステンレス門扉設置																															
建築工事⑯工区(撤去工)												防草マット一時撤去・フェンス・基礎・門扉撤去																															
建築工事⑯工区(基礎・フェンス工)												基礎ブロック・フェンス設置・メッシュ門扉設置・防草マット復旧																															
建築工事⑰工区(撤去工)												防草マット一時撤去・フェンス・基礎撤去																															
建築工事⑰工区(基礎・フェンス工)												基礎ブロック・フェンス設置・防草マット復旧																															
建築工事⑱工区(撤去工)												防草マット一時撤去・フェンス・基礎・門扉撤去																															
産業廃棄物処分	●											コンガラ・金属くず処分																															
騒音・振動	●																																										
行事検査																																											

監理技術者	現場代理人	担当

作業	期間	4月																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
準備工																															
機器・製作期間																															
給水設備工事																															
排水設備工事																															
PIモニタリング設備工事																															
動力制御工事																															
実験排水処理施設																															
水槽基礎工事																															
・行事予定																															

